	COMANDO DA AERONÁUTICA **DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA** **COMISSÃO DE OBRAS DE FORTALEZA (CO-FZ)**	Nº DO DOCUMENTO **BA2/261111/COFZ** EXPEDIÇÃO **11/11/26 · 23:30**

ASSUNTO	**BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO**
OBRA/SERVIÇO	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPUS EM FORTALEZA DO ITA COMPREENDENDO O 1 BLOCO DE ALOJAMENTO E 1 BLOCO DIDÁTICO
LOCAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA - CAMPUS FORTALEZA Av Borges de Melo, 205 - CEP 60415-513 Fortaleza - CE
RESPONSÁVEIS	3S JOÃO FELIPE

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATANTE: Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 86.102,17 m² **CONTRATO:** 120/2025 - SOP

CONTRATADA: Consórcio Cetro/Porto/Morais Engenharia · CNPJ 57.228.483/0001-01

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 313/2025 **DATA DE ASSINATURA DA OS:** 06/08/2025

VIGÊNCIA ORIGINAL: 27 meses **VALOR ORIGINAL:** R$ 79.499.000,00

ADITIVOS: nenhum **TÉRMINO ATUAL:** 06/11/2027 **VALOR ATUALIZADO:** R$ 79.499.000,00

PRAZO DECORRIDO: 462 de 822 dias (56,2%) · restam 360 dias


OS 06/08/2025 hoje 11/11/2026 término 06/11/2027

2. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

INMET · estação automática A305 Fortaleza (a 6 km da obra) · horário de Fortaleza (UTC−3)

PERÍODO	CONDIÇÃO	TEMPERATURA	UMIDADE	CHUVA	VENTO / RAJADA	RADIAÇÃO* % do céu limpo
MANHÃ (6h–12h)	Sem chuva · ensolarado	25,2 – 30,4 °C	62 – 84%	0,0 mm	14 / 38 km/h	76%
TARDE (12h–18h)	Chuva · parcialmente nublado	27,0 – 31,4 °C	58 – 82%	1,6 mm 15h–17h	18 / 47 km/h	50%

Temperatura do dia **24,6 – 31,4 °C** ponto de orvalho 22,8 °C	Umidade relativa **73% média** mínima 58%	Chuva em 24 h **1,6 mm** 2 h com chuva	Vento **até 19 km/h · E** rajada 47 km/h · 1009 hPa

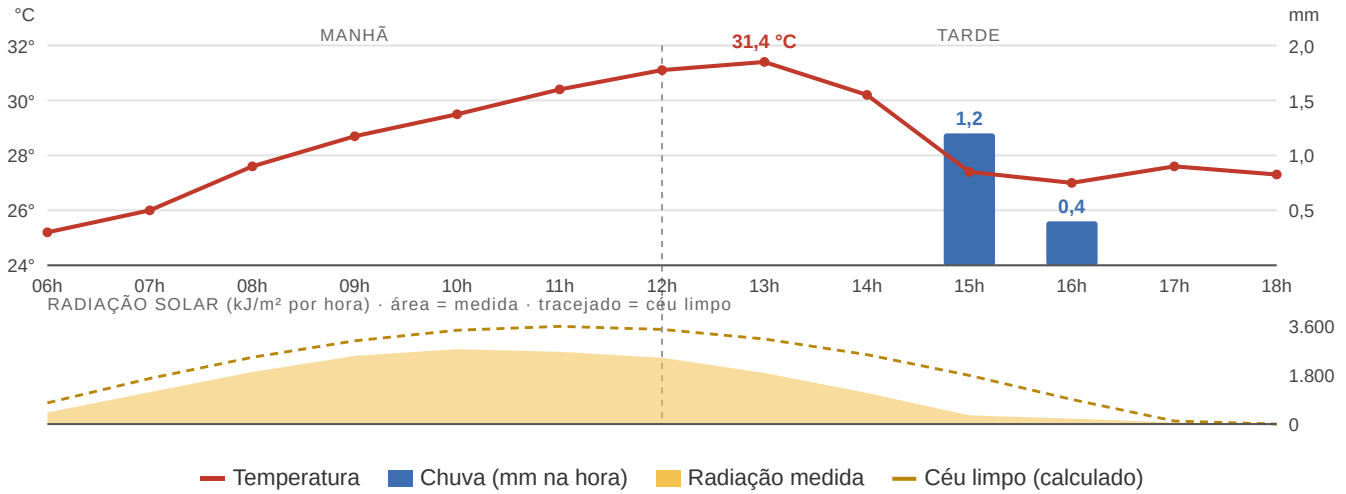

* Céu estimado pela radiação solar medida em relação à de um dia de céu limpo no mesmo local e horário (≥ 75% ensolarado; 45–75% parcialmente nublado; < 45% nublado). Fonte: INMET, dados brutos da estação, obtidos em 11/11/2026 23:25 e convertidos de UTC.

3. INDICADORES

PENDÊNCIAS NO DIA

18	+4	−6	16
abertas no início do dia	abertas no dia	encerradas no dia	abertas ao fim do dia

ACUMULADO DESDE A OS

142 abertas · **126** encerradas taxa de resolução **88,7%**	Abertas há mais de 7 / 15 / 30 dias **9 · 5 · 2**	Tempo médio de resolução **6,4 dias**

ATIVIDADE E CLIMA

11 registros de serviço · **34** fotos **12** ambientes com lançamento · **5** pessoas	Dias com chuva **2** em novembro · **71** desde a OS	Chuva acumulada **7,8 mm** em novembro

OBRA	SERVIÇOS NO DIA	PEND. ABERTAS NO DIA	PEND. ENCERRADAS NO DIA	ABERTAS AO FIM DO DIA	ABERTAS > 15 DIAS
Bloco de Alojamento	7	3	4	10	3
Bloco Didático	4	1	2	6	2
Total da etapa	**11**	**4**	**6**	**16**	**5**

4. SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BLOCO DE ALOJAMENTO

Térreo › Apto. 101 — 08:14 · 3S JOÃO FELIPE

Assentamento de porcelanato 60×60 no piso do quarto; cerca de 70% concluído.



Foto 1 · 08:14



Foto 2 · 08:14

1º pavimento › Circulação norte — 09:40 · CB ALMEIDA

Instalação de eletrocalhas e passagem de cabos da rede de dados entre os eixos 3 e 8.



Foto 1 · 09:40



Foto 2 · 09:40

Térreo › Salão de eventos 14:05 · 3S JOÃO FELIPE

Aplicação da 1ª demão de massa corrida no forro de gesso.



Foto 1 · 14:05

BLOCO DIDÁTICO

Térreo › Sala de aula 03 10:22 · 2S RIBEIRO

Execução de reboco interno nas paredes leste e sul.



Foto 1 · 10:22



Foto 2 · 10:22

Cobertura › Eixos 4 a 7 15:48 · 2S RIBEIRO

Montagem da estrutura metálica da cobertura; terças instaladas até o eixo 6.



Foto 1 · 15:48

Mostrando 5 de 11 registros de serviço do dia; o boletim real lista todos.

5. PENDÊNCIAS ABERTAS NO DIA (4)



BLOCO DE ALOJAMENTO › Térreo › Banheiro Apto. 104
09:02 · 3S JOÃO FELIPE
Caimento do piso do box invertido; água acumula junto à porta.
ABERTA



BLOCO DE ALOJAMENTO › 1º pavimento › Apto. 211
11:30 · CB ALMEIDA
Esquadria da janela com folga e sem vedação de silicone no lado externo.
ABERTA



BLOCO DIDÁTICO › Térreo › Laboratório 1
15:12 · 2S RIBEIRO
Eletroduto aparente fora do projeto na parede norte.
ABERTA



BLOCO DE ALOJAMENTO › Térreo › Circulação sul
16:40 · 3S JOÃO FELIPE
Fissura no reboco acima da porta corta-fogo PCF-02.
ABERTA

6. PENDÊNCIAS ENCERRADAS NO DIA (6)

BLOCO DE ALOJAMENTO › Térreo › Apto. 108 aberta em 03/11 (8 dias)

Pendência: Rejunte falhado no piso do quarto.

Encerramento (13:20 · 3S JOÃO FELIPE): Rejunte refeito em toda a área; conferido com a contratada.



Antes (registro original)



Depois (comprovação)

BLOCO DIDÁTICO › Térreo › Sala de aula 01 aberta em 06/11 (5 dias)

Pendência: Tomada da bancada sem espelho e com fiação exposta.

Encerramento (16:05 · 2S RIBEIRO): Espelho instalado e circuito identificado no quadro QD-T1.



Antes (registro original)



Depois (comprovação)

Mostrando 2 de 6 pendências encerradas no dia.

7. OBSERVAÇÕES

BLOCO DE ALOJAMENTO

10:15 · CP PATRICIO	Visita técnica da fiscalização da SOP-CE ao 1º pavimento, sem ressalvas.
17:40 · 3S JOÃO FELIPE	Efetivo reduzido na frente de pisos (8 de 12 oficiais) por falta de transporte da contratada.

BLOCO DIDÁTICO

14:30 · 2S RIBEIRO	Concretagem da laje do eixo 7 adiada para 13/11 por indisponibilidade da bomba; chuva das 15h às 17h suspendeu o reboco externo.

8. RESPONSÁVEIS

3S JOÃO FELIPE
Fiscal da obra

Emitido automaticamente pelo Fiscal Bot em 11/11/2026 às 23:30 (horário de Fortaleza), com os lançamentos de 11/11/2026. Retificações: nenhuma. Lançamentos deste dia recebidos após a emissão entram no boletim seguinte.
