	COMANDO DA AERONÁUTICA **DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA** **COMISSÃO DE OBRAS DE FORTALEZA (CO-FZ)**	Nº DO DOCUMENTO **BA2/261111/COFZ** EXPEDIÇÃO **11/11/26 · 23:30**

ASSUNTO	**BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO**
OBRA/SERVIÇO	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPUS EM FORTALEZA DO ITA COMPREENDENDO O 1 BLOCO DE ALOJAMENTO E 1 BLOCO DIDÁTICO
LOCAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA - CAMPUS FORTALEZA Av Borges de Melo, 205 - CEP 60415-513 Fortaleza - CE
RESPONSÁVEIS	3S JOÃO FELIPE

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATANTE: Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 86.102,17 m² **CONTRATO:** 120/2025 - SOP

CONTRATADA: Consórcio Cetro/Porto/Morais Engenharia · CNPJ 57.228.483/0001-01

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 313/2025 **DATA DE ASSINATURA DA OS:** 06/08/2025

VIGÊNCIA ORIGINAL: 27 meses **VALOR ORIGINAL:** R$ 79.499.000,00

ADITIVOS: nenhum **TÉRMINO ATUAL:** 06/11/2027 **VALOR ATUALIZADO:** R$ 79.499.000,00

PRAZO DECORRIDO: 462 de 822 dias (56,2%) · restam 360 dias

OS 06/08/2025 hoje 11/11/2026 término 06/11/2027


2. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Ponto da obra −3,7610, −38,5297 · horário de Fortaleza (UTC−3)

PERÍODO	CONDIÇÃO	TEMPERATURA	UMIDADE	CHUVA (modelo)	CHUVA (INMET)	VENTO / RAJADA
MANHÃ (6h–12h)	Chuvisco fraco	25,6 – 30,3 °C	62 – 84%	2,0 mm	0,0 mm	15 / 52 km/h
TARDE (12h–18h)	Sol	28,4 – 31,0 °C	60 – 73%	0,1 mm	0,0 mm	20 / 53 km/h

Temperatura do dia **24,7 – 31,0 °C** sensação até 34,8 °C	Umidade relativa **74% média** mínima 60%	Chuva em 24 h **0,0 mm medido** modelo 3,8 mm	Vento **até 21 km/h · E** rajada 53 km/h · UV 8,9

Fontes divergentes: o modelo indica chuvisco pela manhã (2,0 mm), mas a estação INMET A305 não registrou chuva. Dia contado como **sem chuva** (prevalece o dado medido).

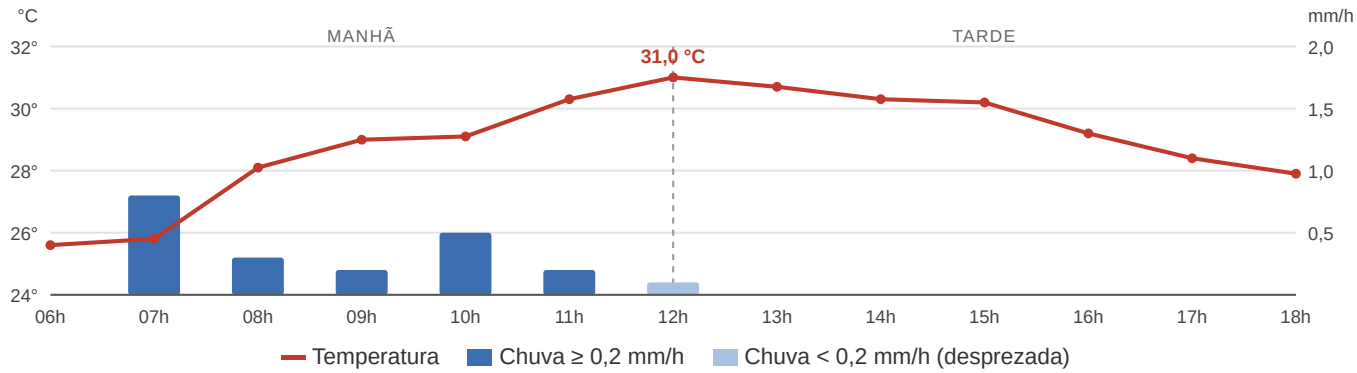

Fontes: Open-Meteo (modelo, no ponto da obra), obtido em 11/11/2026 23:25 · INMET, estação automática A305 Fortaleza (medido).

3. INDICADORES

PENDÊNCIAS NO DIA

18	+4	−6	16
abertas no início do dia	abertas no dia	encerradas no dia	abertas ao fim do dia

ACUMULADO DESDE A OS

142 abertas · **126** encerradas taxa de resolução **88,7%**	Abertas há mais de 7 / 15 / 30 dias **9 · 5 · 2**	Tempo médio de resolução **6,4 dias**

ATIVIDADE E CLIMA

11 registros de serviço · **34** fotos **12** ambientes com lançamento · **5** pessoas	Dias com chuva **1** em novembro · **71** desde a OS	Chuva acumulada **6,2 mm** em novembro

OBRA	SERVIÇOS NO DIA	PEND. ABERTAS NO DIA	PEND. ENCERRADAS NO DIA	ABERTAS AO FIM DO DIA	ABERTAS > 15 DIAS
Bloco de Alojamento	7	3	4	10	3
Bloco Didático	4	1	2	6	2
Total da etapa	**11**	**4**	**6**	**16**	**5**

4. SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BLOCO DE ALOJAMENTO

Térreo › Apto. 101 — 08:14 · 3S João Felipe

Assentamento de porcelanato 60×60 no piso do quarto; cerca de 70% concluído.



Foto 1 · 08:14



Foto 2 · 08:14

1º pavimento › Circulação norte — 09:40 · Cb Almeida

Instalação de eletrocalhas e passagem de cabos da rede de dados entre os eixos 3 e 8.




Foto 1 · 09:40




Foto 2 · 09:40

Térreo › Salão de eventos 14:05 · 3S João Felipe

Aplicação da 1ª demão de massa corrida no forro de gesso.



Foto 1 · 14:05

BLOCO DIDÁTICO

Térreo › Sala de aula 03 10:22 · 2S Ribeiro

Execução de reboco interno nas paredes leste e sul.



Foto 1 · 10:22



Foto 2 · 10:22

Cobertura › Eixos 4 a 7 15:48 · 2S Ribeiro

Montagem da estrutura metálica da cobertura; terças instaladas até o eixo 6.



Foto 1 · 15:48

Mostrando 5 de 11 registros de serviço do dia; o boletim real lista todos.

5. PENDÊNCIAS ABERTAS NO DIA (4)



BLOCO DE ALOJAMENTO › Térreo › Banheiro Apto. 104

09:02 · 3S João Felipe

Caimento do piso do box invertido; água acumula junto à porta.

ABERTA



BLOCO DE ALOJAMENTO › 1º pavimento › Apto. 211

11:30 · Cb Almeida

Esquadria da janela com folga e sem vedação de silicone no lado externo.

ABERTA



BLOCO DIDÁTICO › Térreo › Laboratório 1
15:12 · 2S Ribeiro
Eletroduto aparente fora do projeto na parede norte.
ABERTA



BLOCO DE ALOJAMENTO › Térreo › Circulação sul
16:40 · 3S João Felipe
Fissura no reboco acima da porta corta-fogo PCF-02.
ABERTA

6. PENDÊNCIAS ENCERRADAS NO DIA (6)

BLOCO DE ALOJAMENTO › Térreo › Apto. 108 — aberta em 03/11 (8 dias)
Pendência: Rejunte falhado no piso do quarto.
Encerramento (13:20 · 3S João Felipe): Rejunte refeito em toda a área; conferido com a contratada.



Antes (registro original)



Depois (comprovação)

BLOCO DIDÁTICO › Térreo › Sala de aula 01 — aberta em 06/11 (5 dias)
Pendência: Tomada da bancada sem espelho e com fiação exposta.
Encerramento (16:05 · 2S Ribeiro): Espelho instalado e circuito identificado no quadro QD-T1.



Antes (registro original)



Depois (comprovação)

Mostrando 2 de 6 pendências encerradas no dia.

7. OBSERVAÇÕES

Sem observações. (Preenchidas pelo fiscal em uma retificação, quando houver.)

8. RESPONSÁVEIS

3S JOÃO FELIPE
Fiscal da obra

Emitido automaticamente pelo Fiscal Bot em 11/11/2026 às 23:30 (horário de Fortaleza), com os lançamentos de 11/11/2026. Retificações: nenhuma. Lançamentos deste dia recebidos após a emissão entram no boletim seguinte.
